

**REGIONE PIEMONTE**  
**CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**  
**COMUNE DI MONTALENGHE**



**PROGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO  
SITO IN VIA CAVOUR N. 3 PER REALIZZAZIONE  
AMBULATORIO MEDICO**

**PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**

**PROPRIETA': COMUNE DI MONTALENGHE**

Partita IVA 01156620013

Via Cavour n. 2 - 10090 Montalenghe (TO)

Tel. 011.9839458 - Fax 011.9839202

e-mail: [info@comune.montalenghe.to.it](mailto:info@comune.montalenghe.to.it)

**PROGETTISTA: ARCH. NIGRO DOMENICO**

Firma \_\_\_\_\_

Partita IVA 04246660015

Strada per Cucelio n. 27 - 10090 Vialfre' (TO)

Tel. 0125739333

e-mail: [arch.nigro@libero.it](mailto:arch.nigro@libero.it)

Timbro e Firma \_\_\_\_\_



<b>TAVOLA</b> <b>L</b> OTTOBRE 2017	<b>OGGETTO</b> <b>CRONOPROGRAMMA</b>
---	---

**Comune di MONTALENGHE**

**Città Metropolitana di Torino**

# **Cronoprogramma di PROGETTO**

**OGGETTO:** Manutenzione straordinaria fabbricato sito in via Cavour n.° 3 per realizzazione ambulatorio medico


**COMMITTENTE:** Amministrazione Comunale di Montalenghe


Vialfrè, 25/10/2017

Il Tecnico  
(Arch. Domenico NIGRO )


---


Domenico NIGRO architetto  
Via per Cuceglio, 27 - 10090 VIALFRE' (TO)

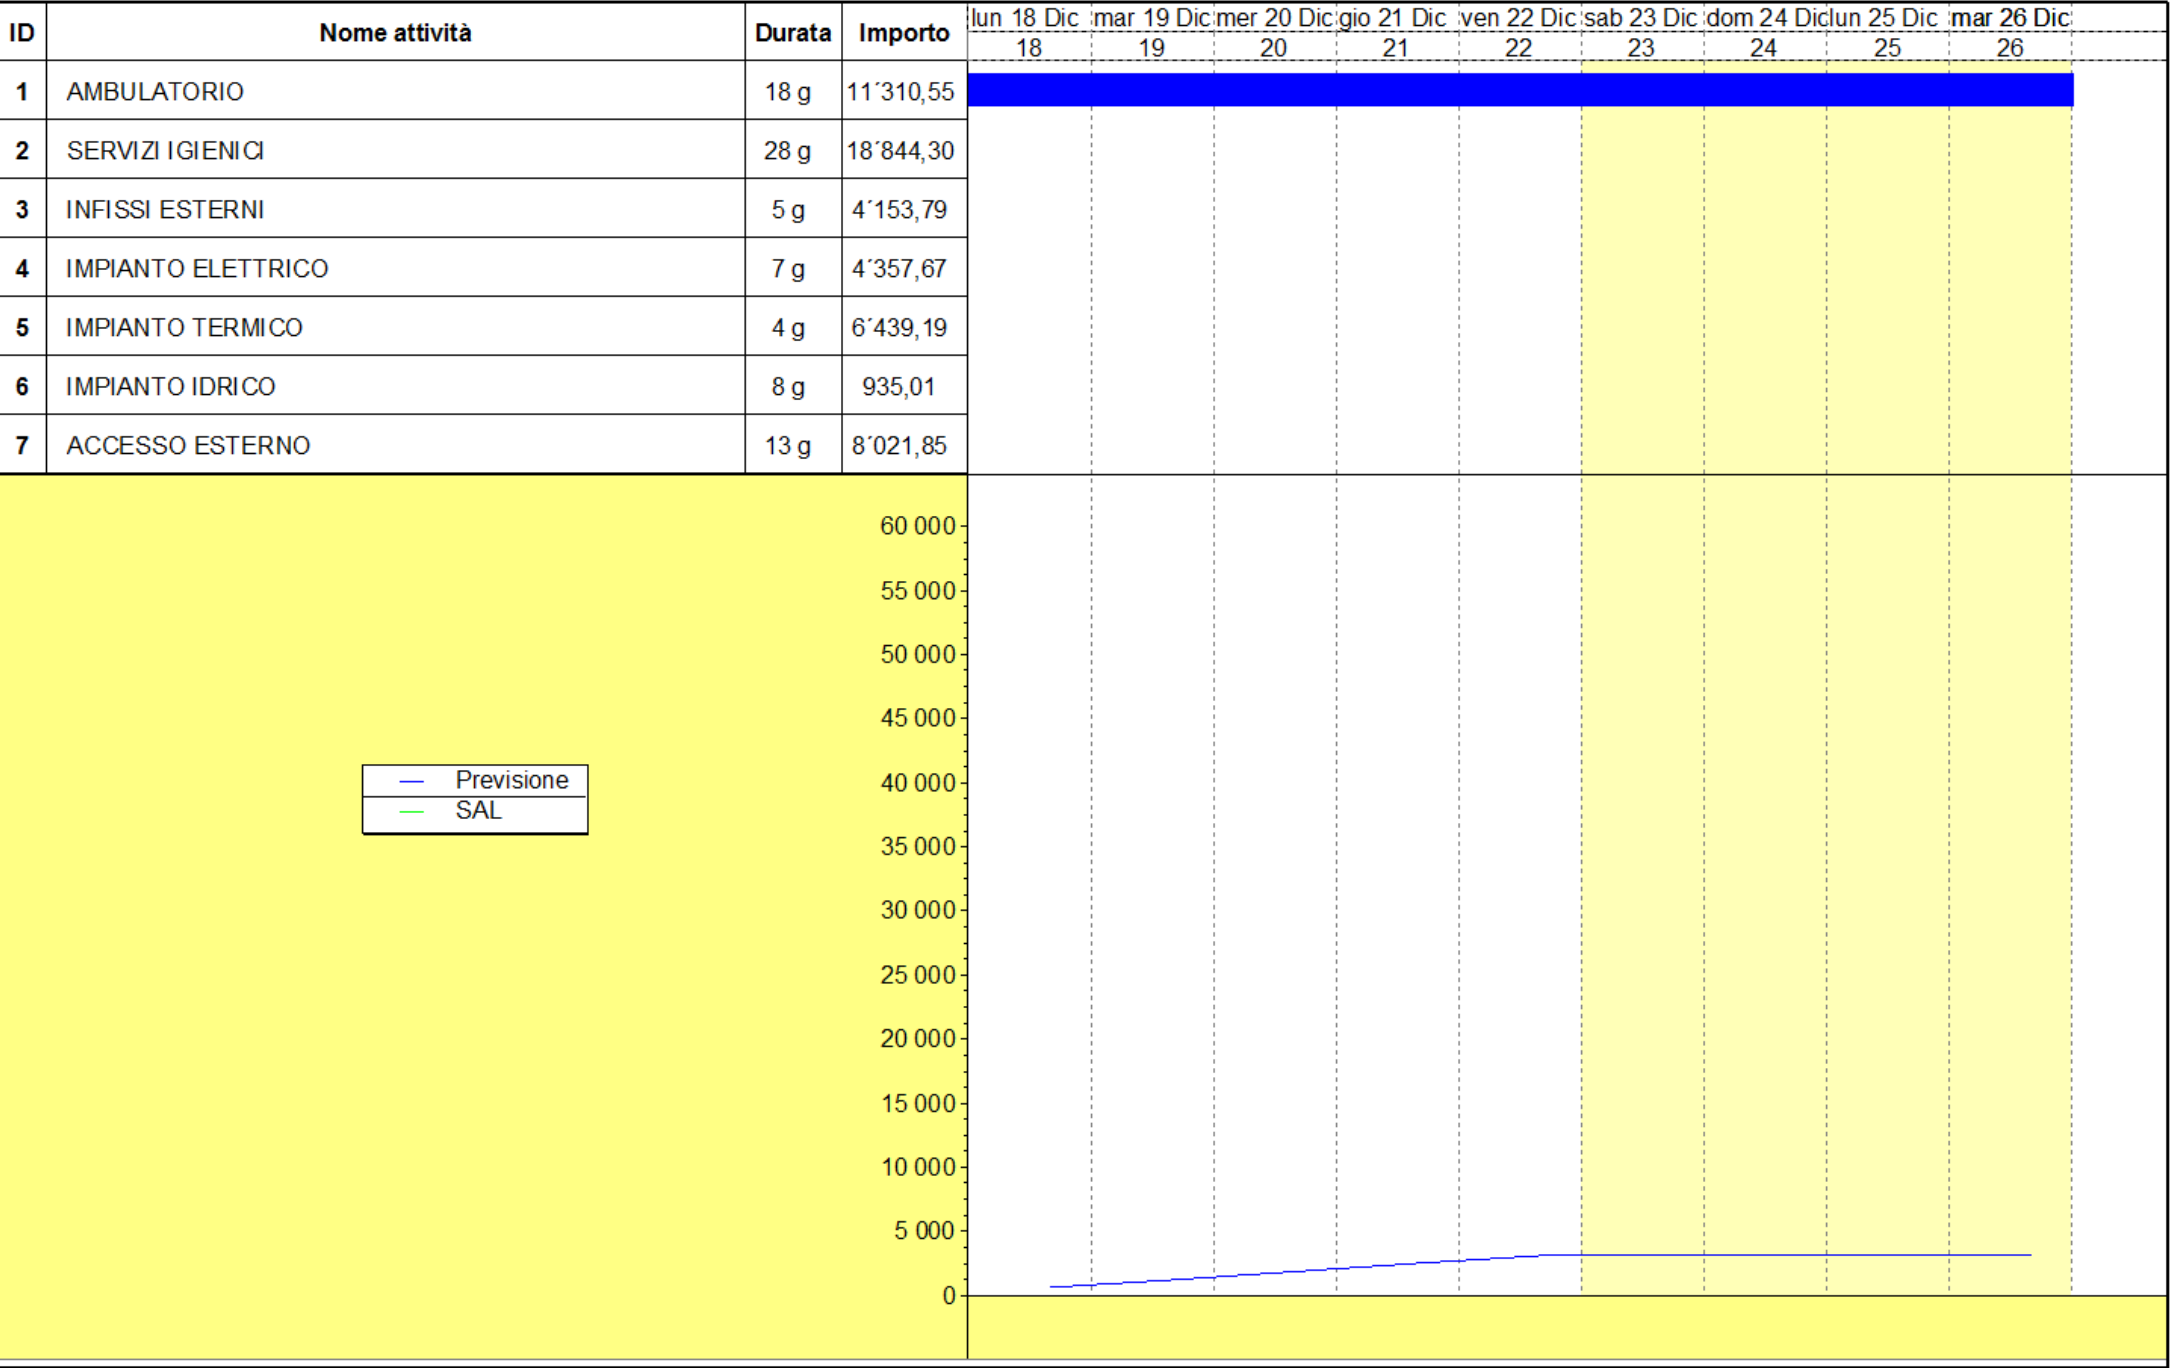


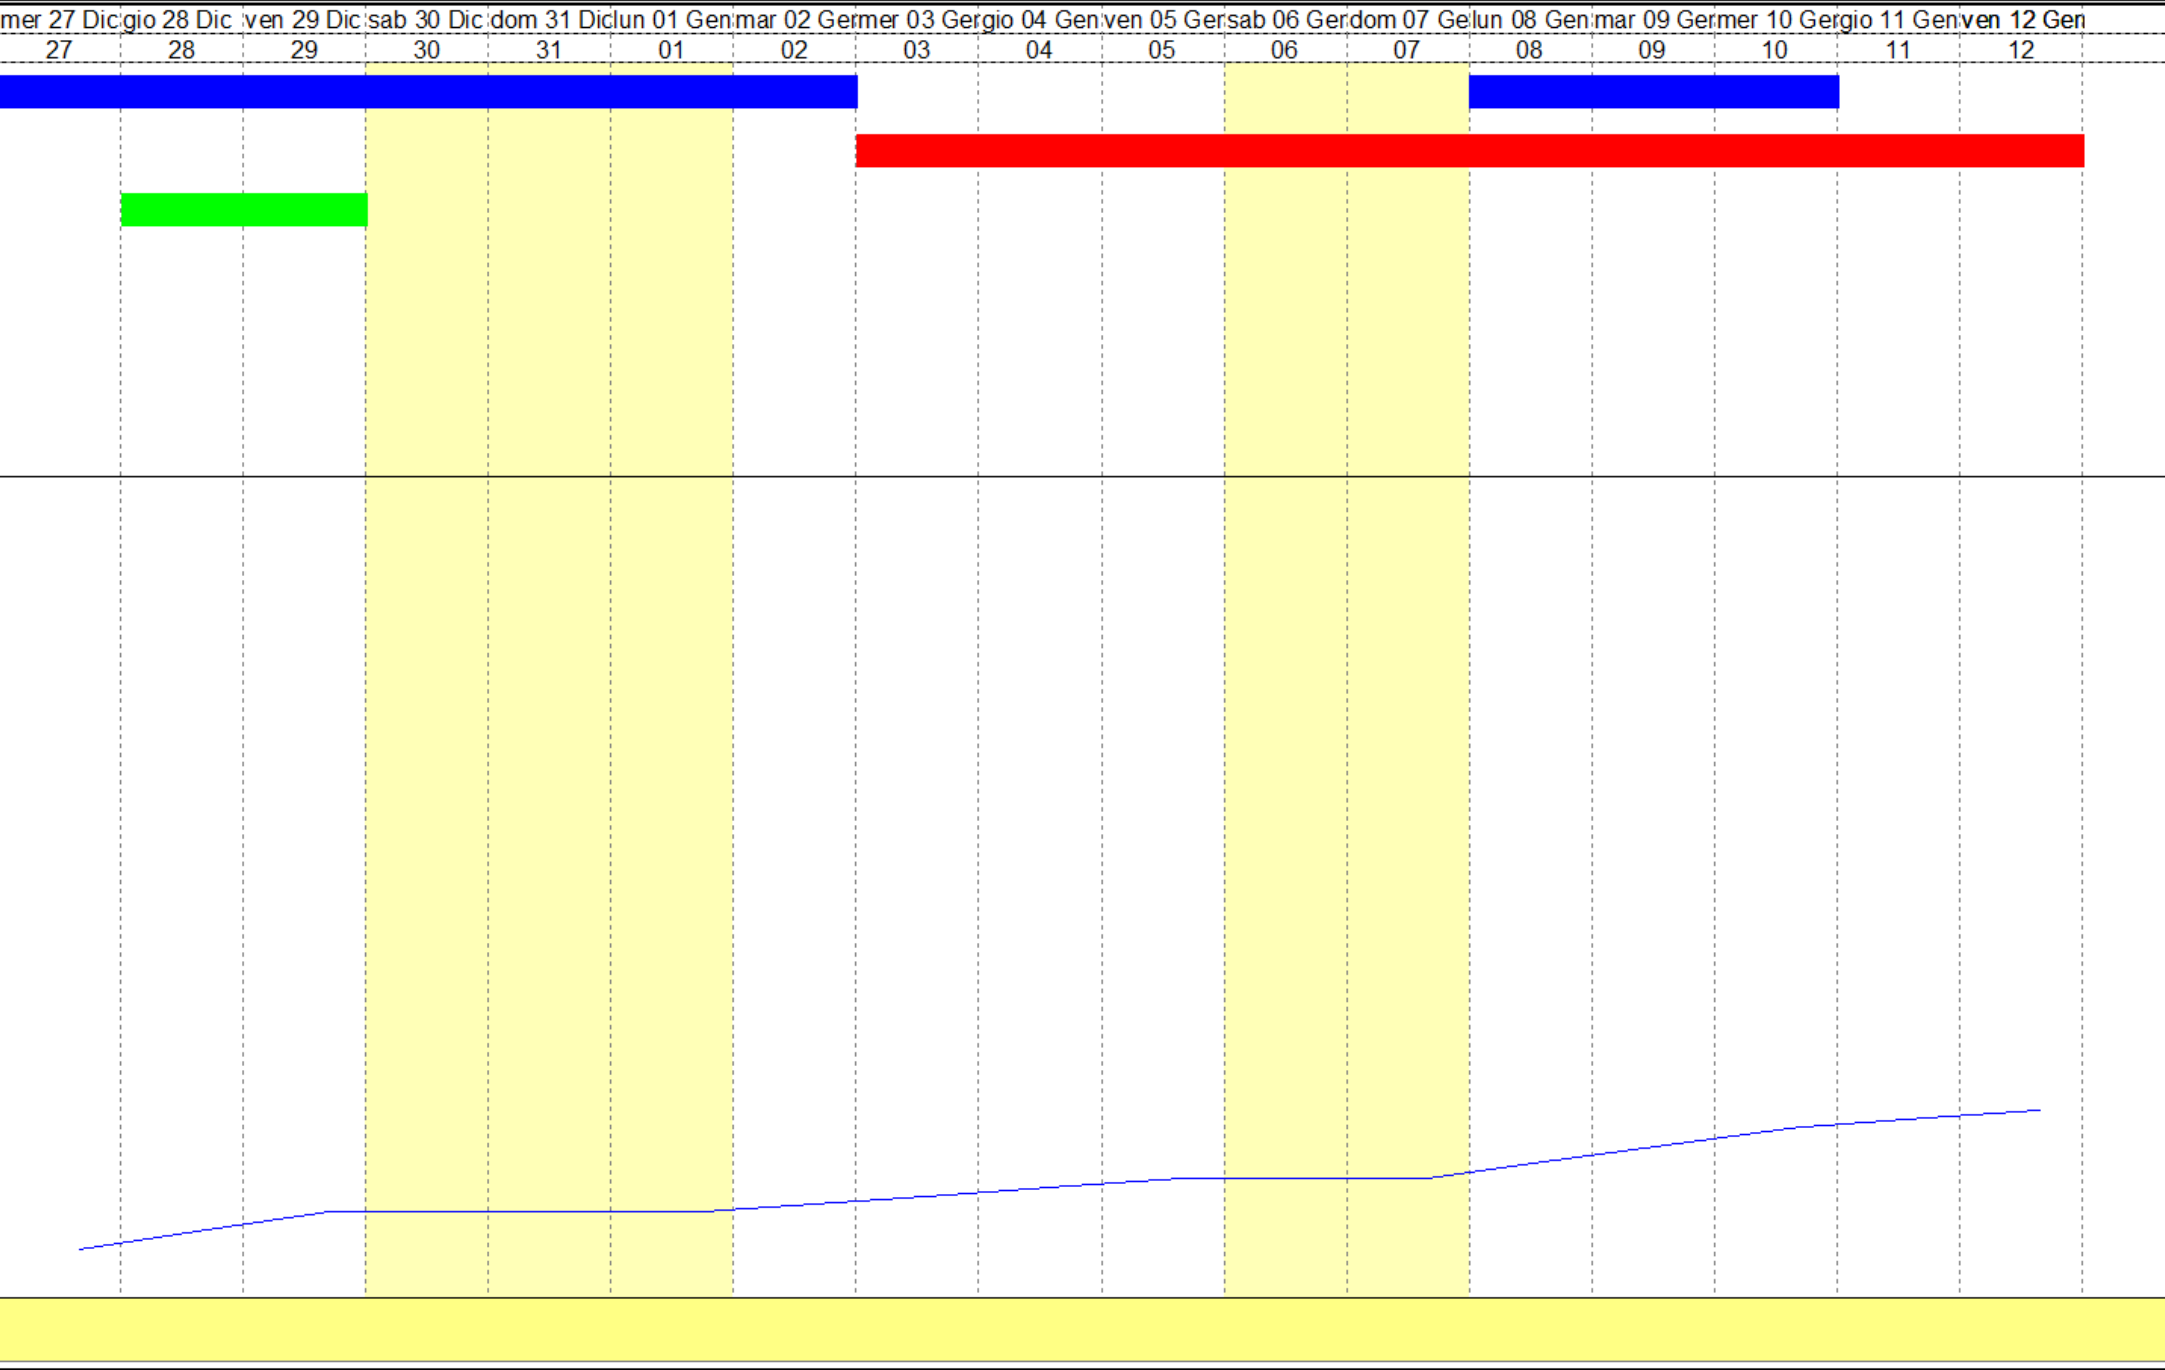



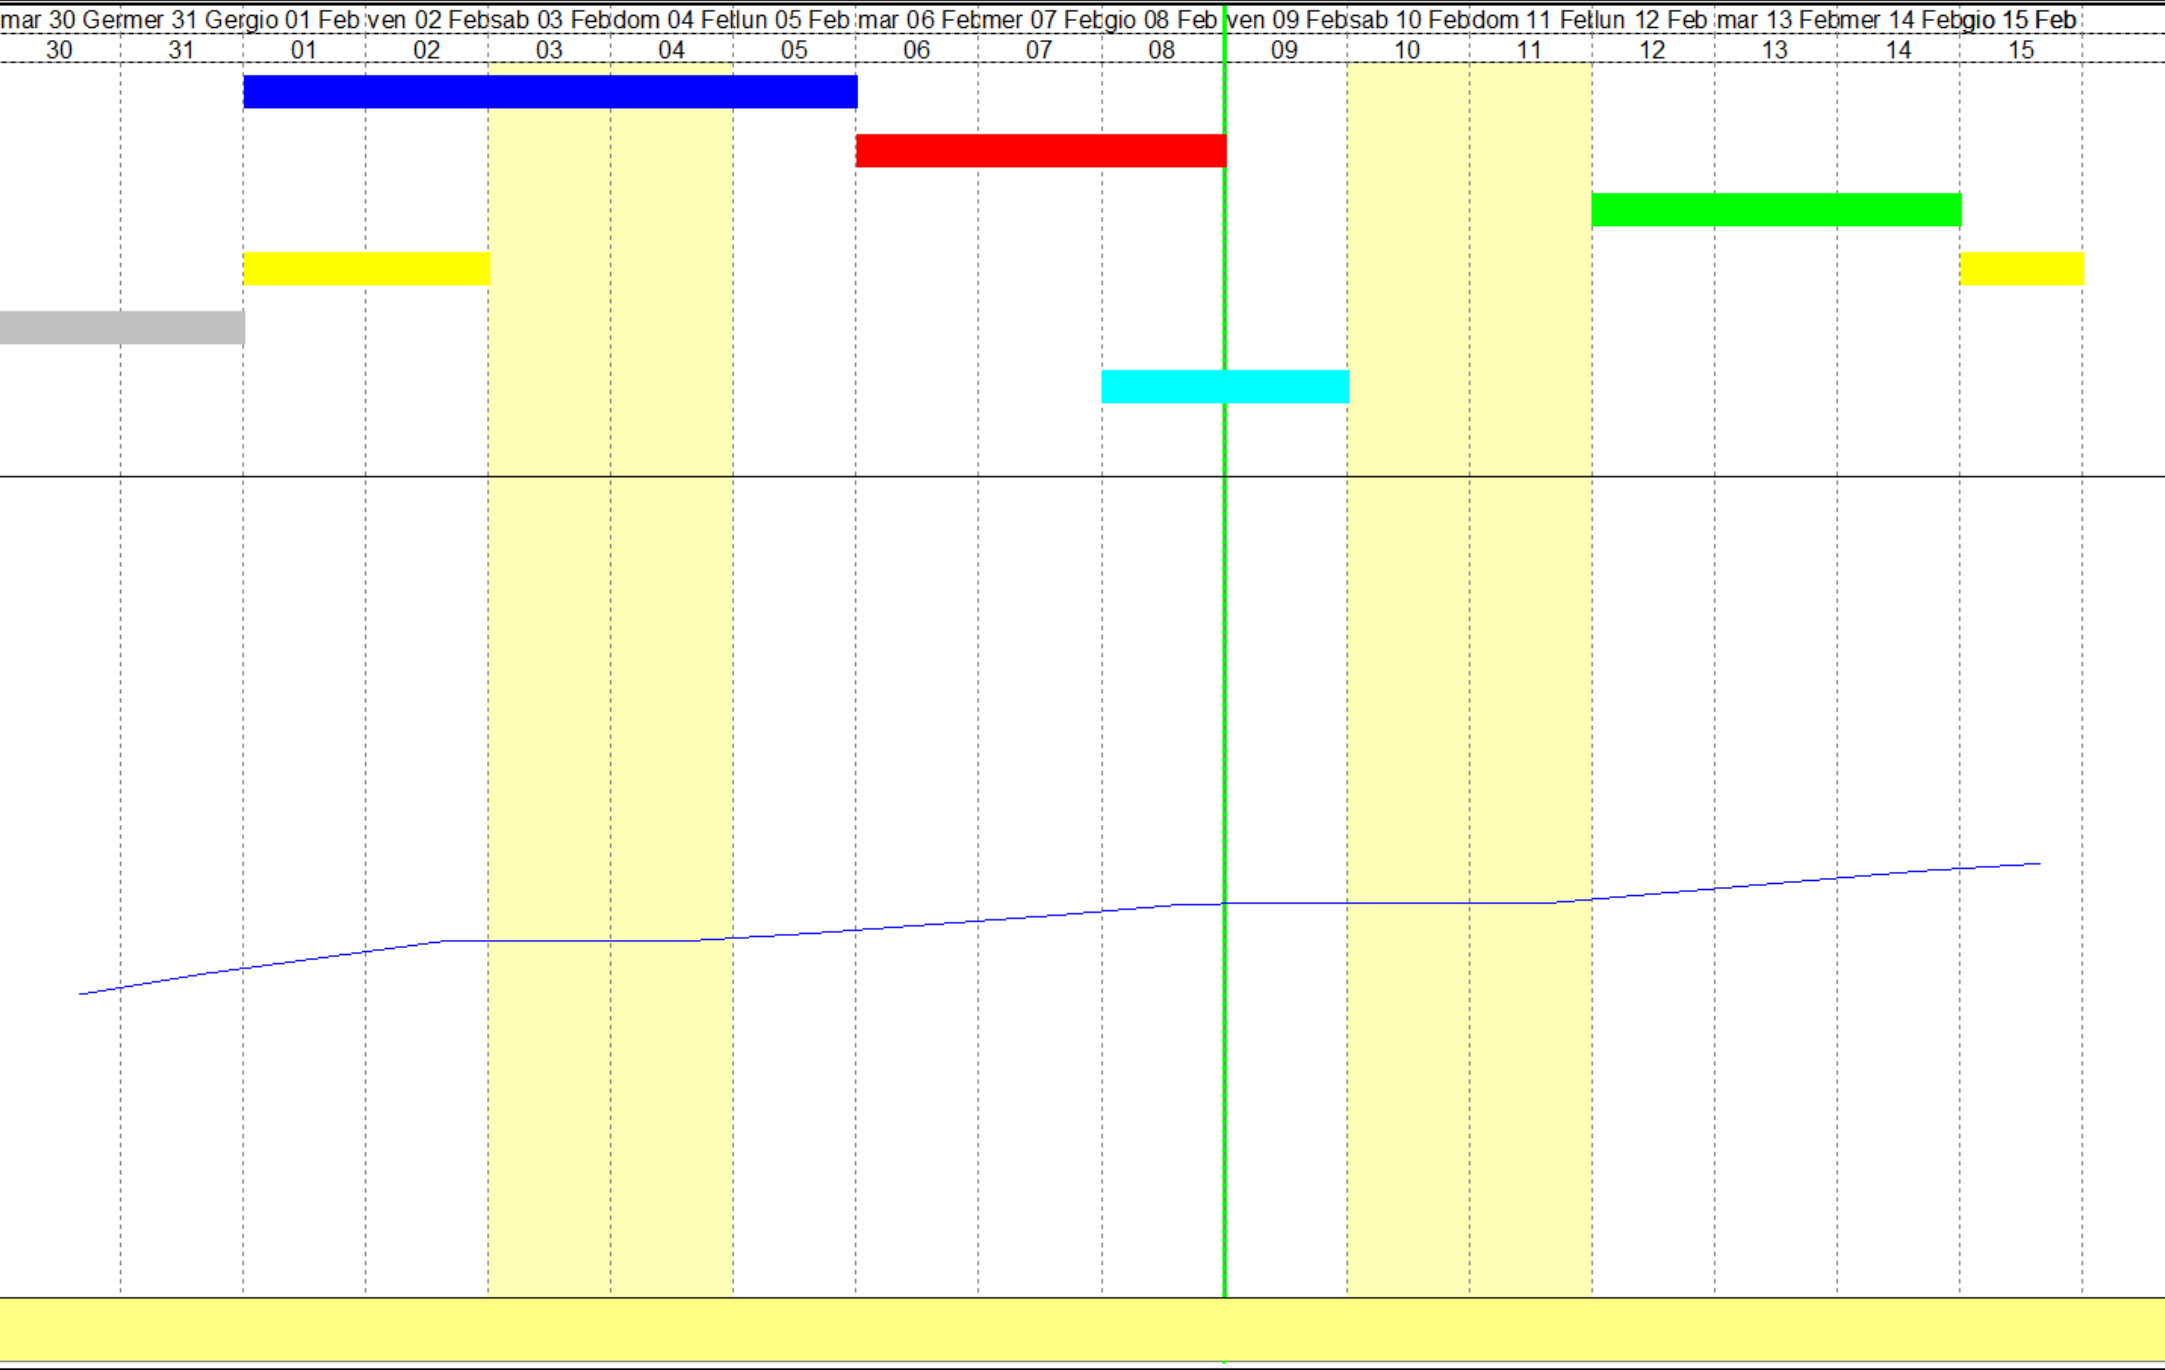

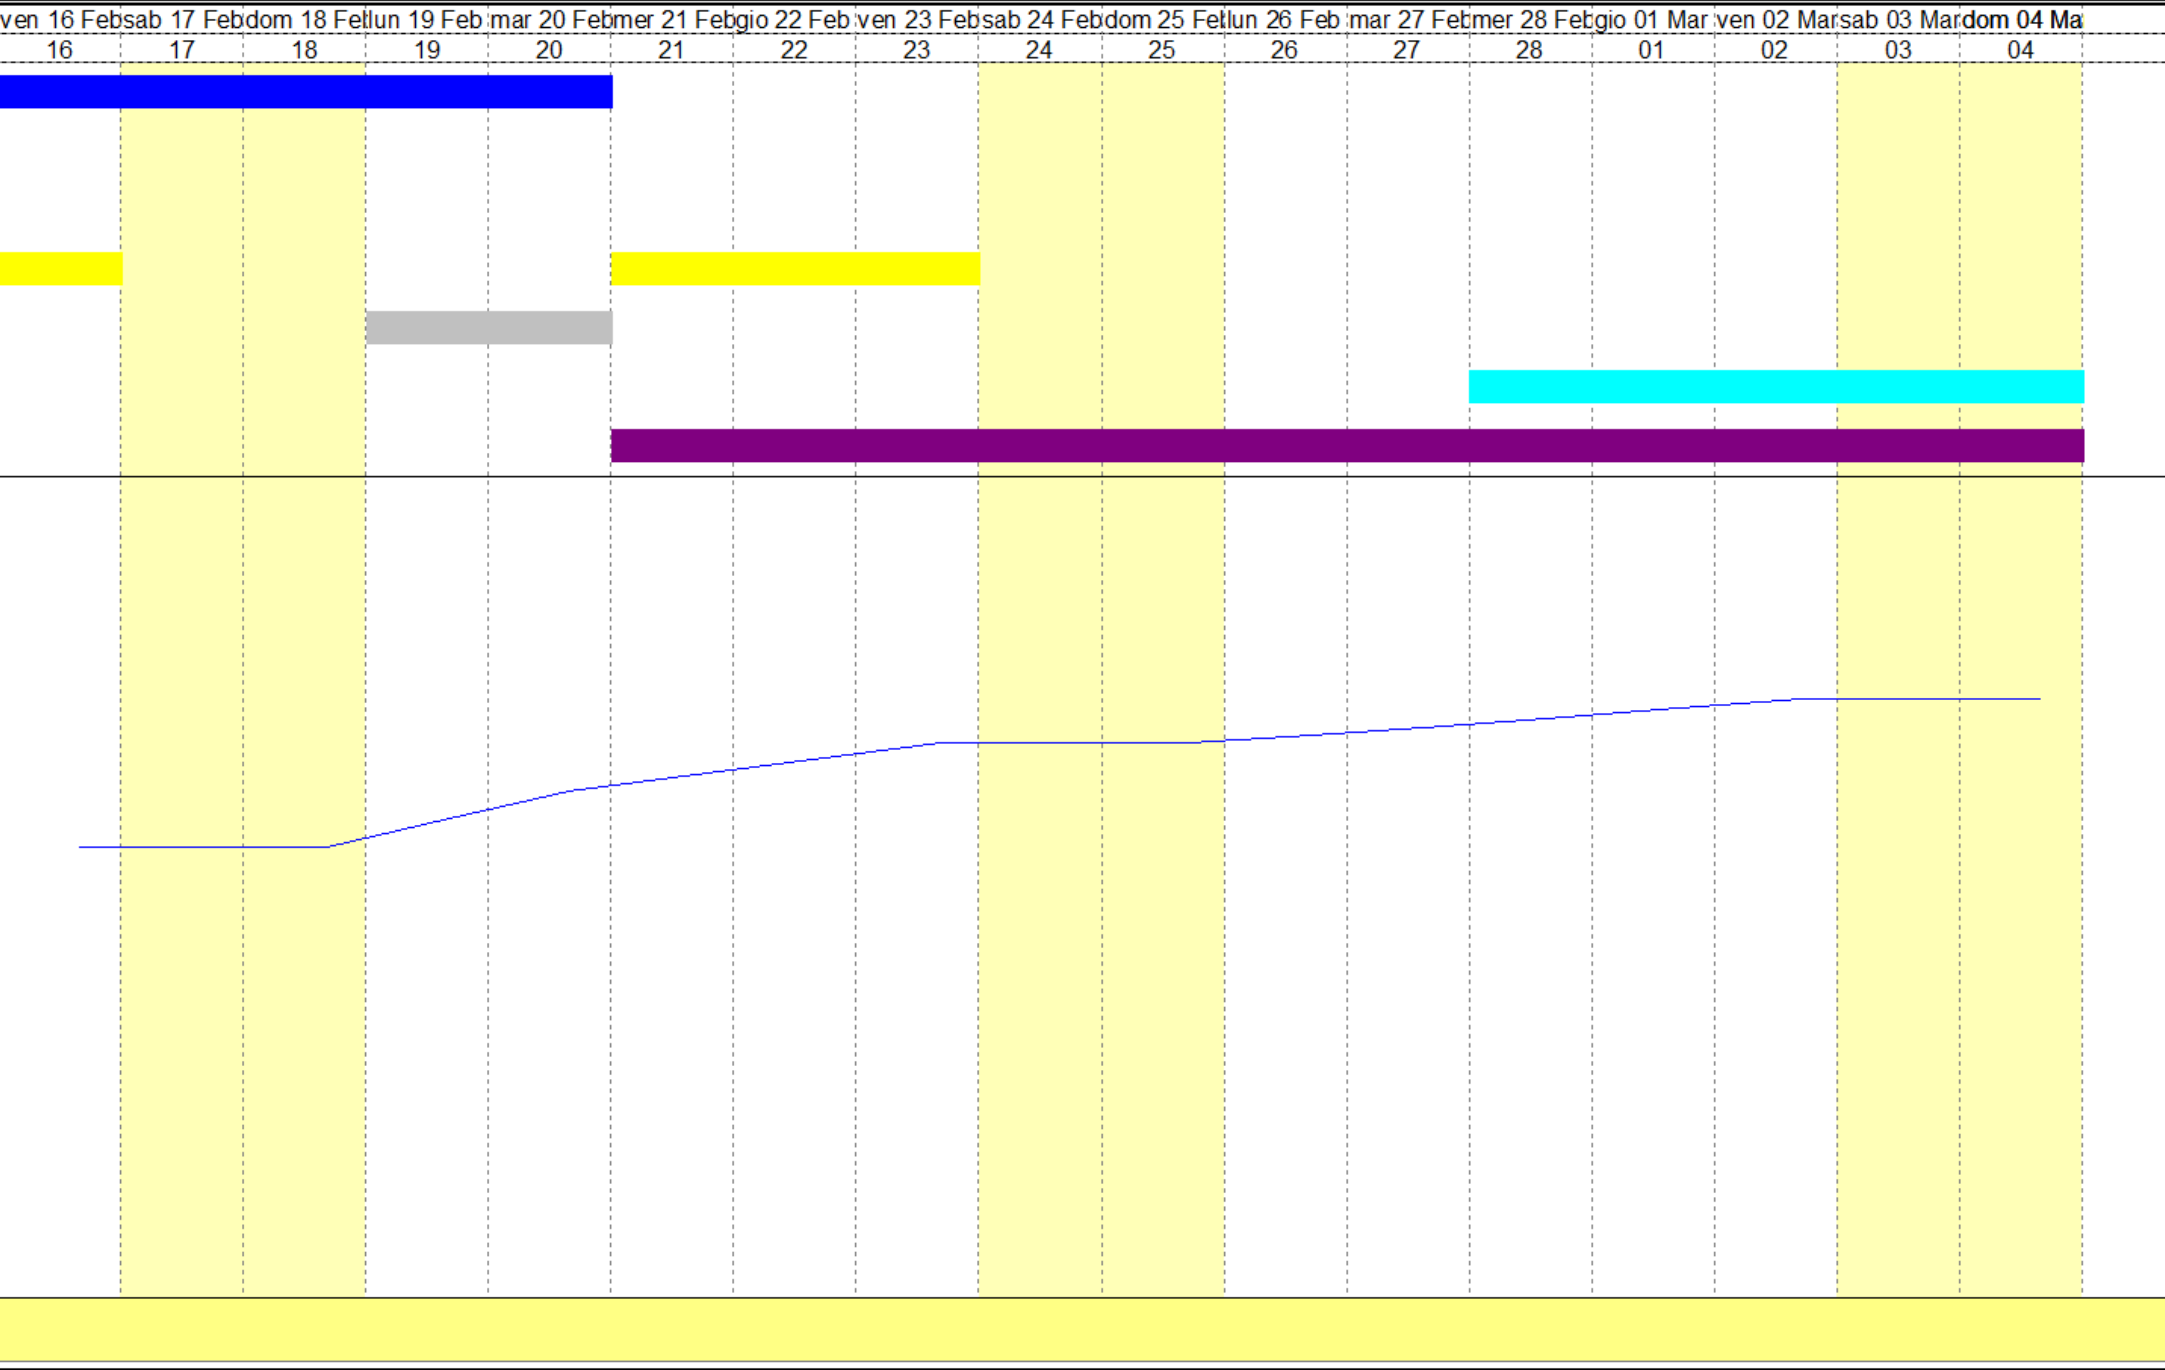

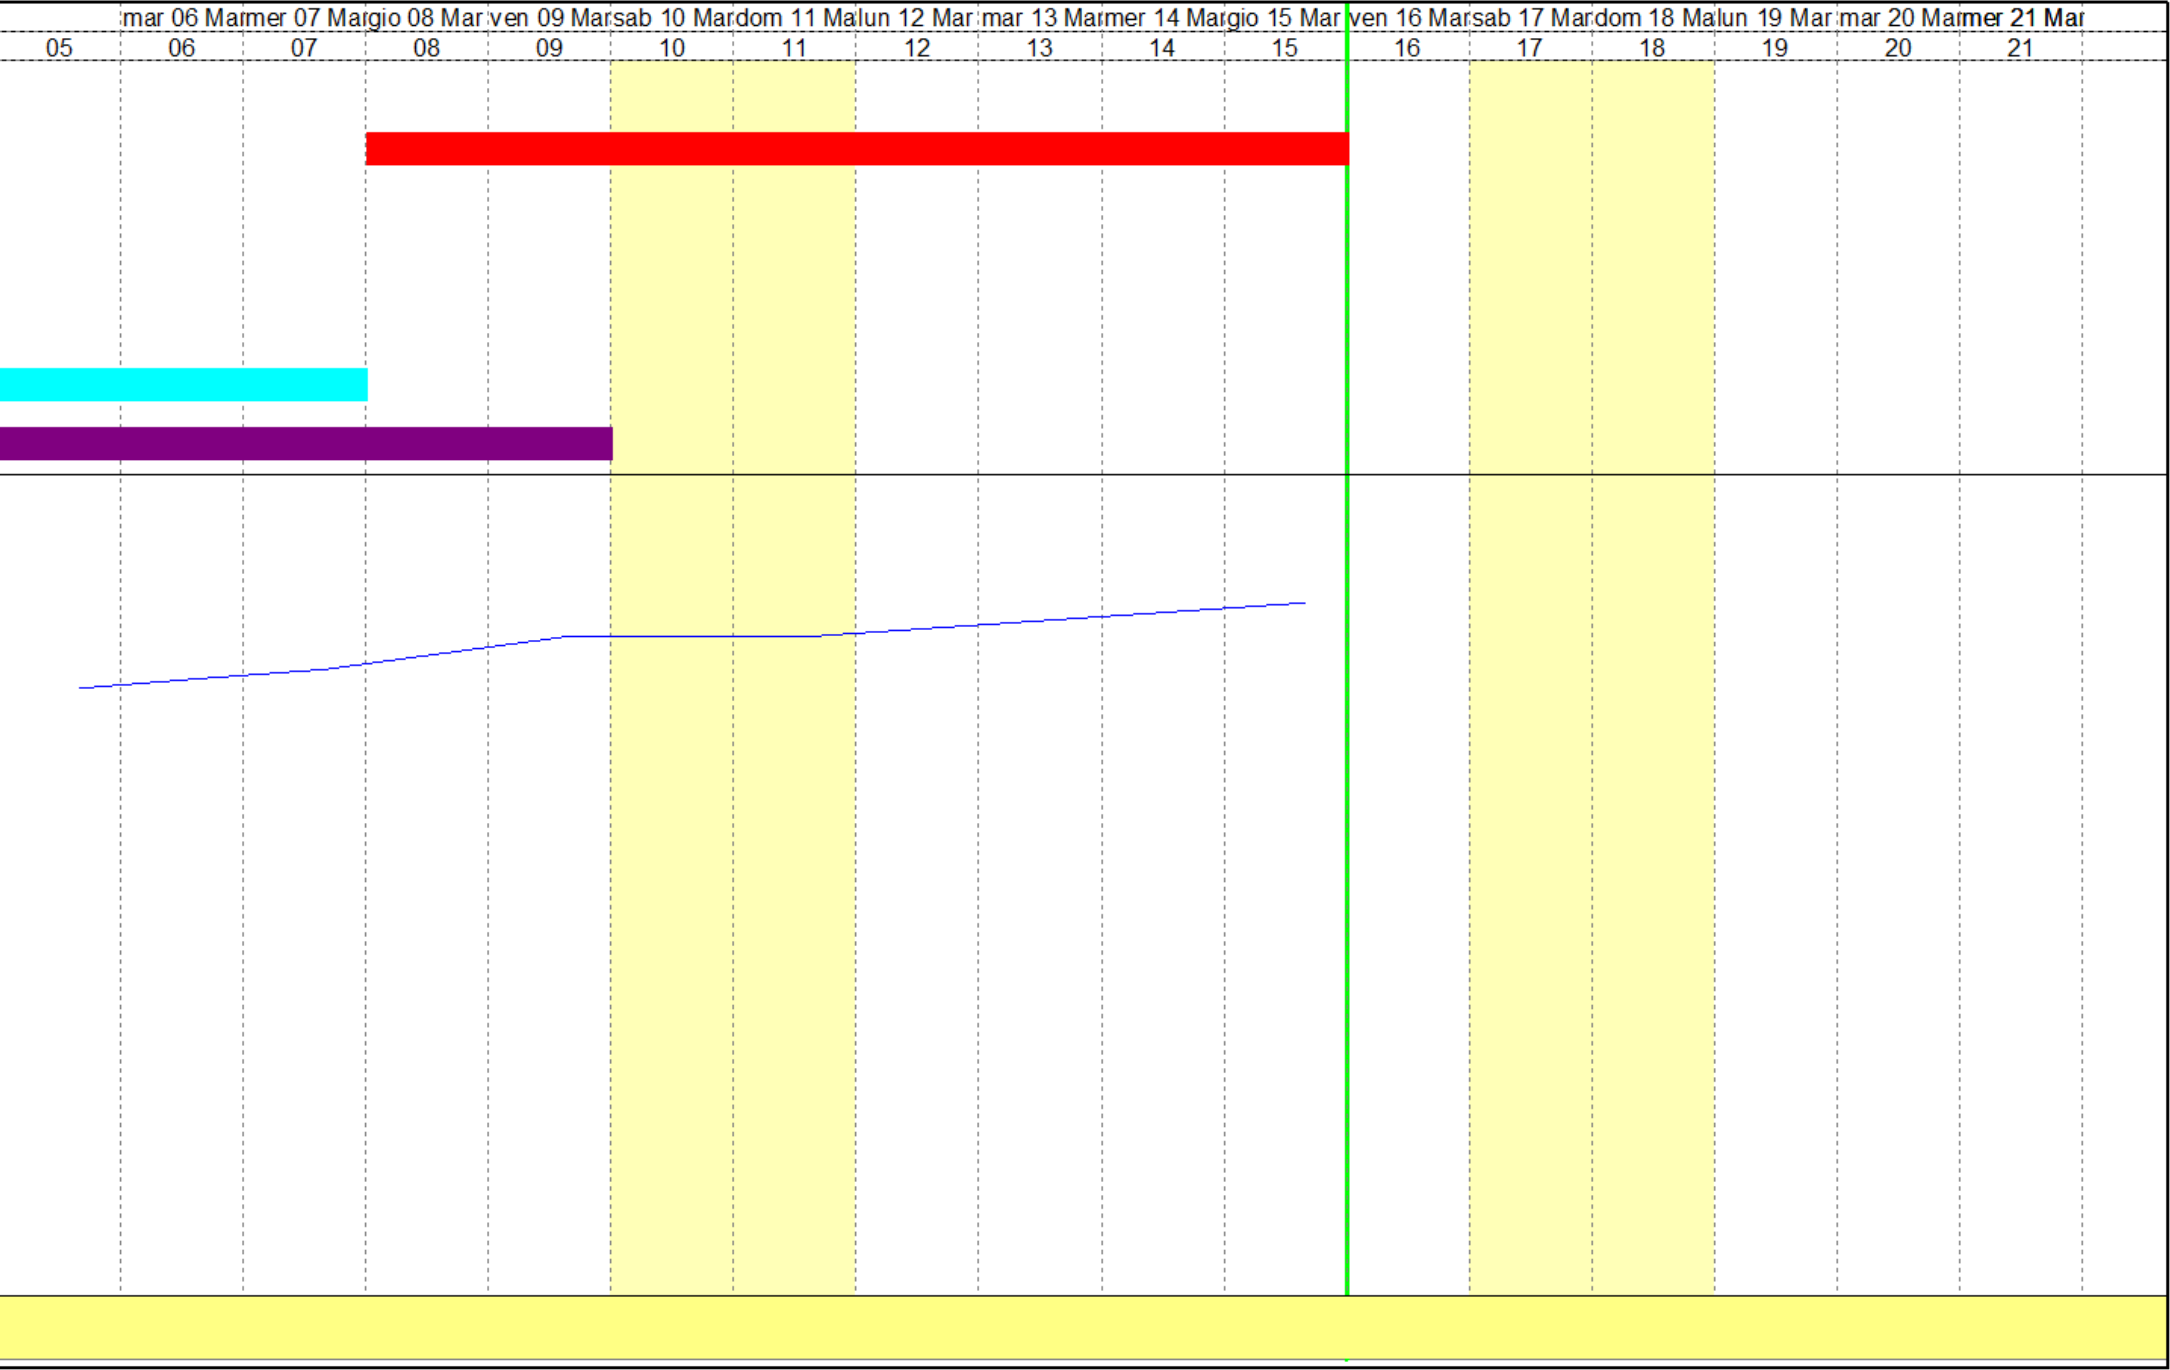



**Comune di MONTALENGHE**

**Città Metropolitana di Torino**

## **Tabella Attività**

**OGGETTO:** Manutenzione straordinaria fabbricato sito in via Cavour n.° 3 per realizzazione ambulatorio medico

**COMMITTENTE:** Amministrazione Comunale di Montalenghe

Vialfrè, 25/10/2017

Il Tecnico  
(Arch. Domenico NIGRO )

---

Domenico NIGRO architetto  
Via per Cuceglio, 27 - 10090 VIALFRE' (TO)

ATTIVITA'		PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
		euro	(%)			Lav.	Tot.
AMBULATORIO		11'310,55	20,921	18/12/2017	20/02/2018	18	29
	<i>periodo 01</i>	5'655,28	10,461	18/12/2017	02/01/2018	9	16
	<i>periodo 02</i>	1'922,79	3,557	08/01/2018	10/01/2018	3	3
	<i>periodo 03</i>	1'922,79	3,557	01/02/2018	05/02/2018	3	5
	<i>periodo 04</i>	1'809,69	3,347	16/02/2018	20/02/2018	3	5
SERVIZI IGIENICI		18'844,30	34,857	03/01/2018	15/03/2018	28	38
	<i>periodo 01</i>	12'814,12	23,702	03/01/2018	29/01/2018	19	27
	<i>periodo 02</i>	2'072,87	3,834	06/02/2018	08/02/2018	3	3
	<i>periodo 03</i>	3'957,30	7,320	08/03/2018	15/03/2018	6	8
INFISSI ESTERNI		4'153,79	7,683	28/12/2017	14/02/2018	5	5
	<i>periodo 01</i>	1'661,52	3,073	28/12/2017	29/12/2017	2	2
	<i>periodo 02</i>	2'492,27	4,610	12/02/2018	14/02/2018	3	3
IMPIANTO ELETTRICO		4'357,67	8,060	01/02/2018	23/02/2018	7	7
	<i>periodo 01</i>	1'263,72	2,338	01/02/2018	02/02/2018	2	2
	<i>periodo 02</i>	1'263,72	2,338	15/02/2018	16/02/2018	2	2
	<i>periodo 03</i>	1'830,22	3,385	21/02/2018	23/02/2018	3	3
IMPIANTO TERMICO		6'439,19	11,911	30/01/2018	20/02/2018	4	4
	<i>periodo 01</i>	3'219,60	5,955	30/01/2018	31/01/2018	2	2
	<i>periodo 02</i>	3'219,60	5,955	19/02/2018	20/02/2018	2	2
IMPIANTO IDRICO		935,01	1,730	08/02/2018	07/03/2018	8	10
	<i>periodo 01</i>	233,75	0,432	08/02/2018	09/02/2018	2	2
	<i>periodo 02</i>	701,26	1,297	28/02/2018	07/03/2018	6	8
ACCESSO ESTERNO		8'021,85	14,838	21/02/2018	09/03/2018	13	17
Vialfrè, 25/10/2017							
<p><b>Tecnico</b> Arch. Domenico NIGRO</p>							

**Comune di MONTALENGHE**

**Città Metropolitana di Torino**

## **Tabella Date e Importi**

**OGGETTO:** Manutenzione straordinaria fabbricato sito in via Cavour n.° 3 per realizzazione ambulatorio medico

**COMMITTENTE:** Amministrazione Comunale di Montalenghe

Vialfrè, 25/10/2017

Il Tecnico  
(Arch. Domenico NIGRO )

---

Domenico NIGRO architetto  
Via per Cuceglio, 27 - 10090 VIALFRE' (TO)

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
18/12/2017	628,36	628,36	1,162
19/12/2017	628,36	1'256,73	2,325
20/12/2017	628,36	1'885,09	3,487
21/12/2017	628,36	2'513,46	4,649
22/12/2017	628,36	3'141,82	5,811
27/12/2017	628,36	3'770,18	6,974
28/12/2017	1'459,12	5'229,31	9,673
29/12/2017	1'459,12	6'688,43	12,372
02/01/2018	628,36	7'316,79	13,534
03/01/2018	674,43	7'991,22	14,781
04/01/2018	674,43	8'665,65	16,029
05/01/2018	674,43	9'340,07	17,276
08/01/2018	1'315,36	10'655,43	19,710
09/01/2018	1'315,36	11'970,79	22,143
10/01/2018	1'315,36	13'286,15	24,576
11/01/2018	674,43	13'960,58	25,823
12/01/2018	674,43	14'635,01	27,071
15/01/2018	674,43	15'309,43	28,318
16/01/2018	674,43	15'983,86	29,566
17/01/2018	674,43	16'658,29	30,813
18/01/2018	674,43	17'332,72	32,061
19/01/2018	674,43	18'007,14	33,308
22/01/2018	674,43	18'681,57	34,556
23/01/2018	674,43	19'356,00	35,803
24/01/2018	674,43	20'030,43	37,051
25/01/2018	674,43	20'704,85	38,298
26/01/2018	674,43	21'379,28	39,546
29/01/2018	674,43	22'053,71	40,793
30/01/2018	1'609,80	23'663,51	43,771
31/01/2018	1'609,80	25'273,30	46,748
01/02/2018	1'272,79	26'546,10	49,103
02/02/2018	1'272,79	27'818,89	51,457
05/02/2018	640,93	28'459,82	52,643
06/02/2018	690,96	29'150,78	53,921
07/02/2018	690,96	29'841,74	55,199
08/02/2018	807,83	30'649,57	56,693
09/02/2018	116,88	30'766,45	56,909
12/02/2018	830,76	31'597,20	58,446
13/02/2018	830,76	32'427,96	59,983
14/02/2018	830,76	33'258,72	61,519
15/02/2018	631,86	33'890,58	62,688

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
16/02/2018	1'235,09	35'125,68	64,973
19/02/2018	2'213,03	37'338,70	69,066
20/02/2018	2'213,03	39'551,73	73,159
21/02/2018	1'227,14	40'778,87	75,429
22/02/2018	1'227,14	42'006,01	77,699
23/02/2018	1'227,14	43'233,15	79,969
26/02/2018	617,07	43'850,21	81,110
27/02/2018	617,07	44'467,28	82,252
28/02/2018	733,94	45'201,22	83,609
01/03/2018	733,94	45'935,16	84,967
02/03/2018	733,94	46'669,10	86,325
05/03/2018	733,94	47'403,04	87,682
06/03/2018	733,94	48'136,99	89,040
07/03/2018	733,95	48'870,93	90,397
08/03/2018	1'276,62	50'147,55	92,759
09/03/2018	1'276,62	51'424,17	95,120
12/03/2018	659,55	52'083,72	96,340
13/03/2018	659,55	52'743,27	97,560
14/03/2018	659,55	53'402,82	98,780
15/03/2018	659,55	54'062,37	100,000
Vialfrè, 25/10/2017			
<p><b>Tecnico</b> Arch. Domenico NIGRO</p>			
